

Verslag Inloop Schetsontwerp

Plaats Arnhem

Datum 10 april

Tijd 19.00-21.00 uur

Positieve reacties op schetsontwerp Groot Onderhoud De Bakenberg

Ongeveer 60 bewoners van De Bakenberg bezochten op woensdagavond 10 april de 'Inloop Schetsontwerp' Groot Onderhoud De Bakenberg in de kerk van Schaarsbergen. Door de inloop zijn bewoners op de hoogte van de laatste stand van zaken in de ontwerpfase van het geplande Groot Onderhoud. Aanleiding voor dit project is groot onderhoud aan een aantal wegen en het oplossen van wateroverlast bij extreme neerslag.

Verloop van de inloop

Bij aankomst keken deelnemers in een kort filmpje naar de strategie voor de hele wijk, zoals het bouwteam van gemeente Arnhem en Roelofs die voorstelt. Deze strategie is mede ontstaan op basis van input die een werkgroep en een klankbordgroep van bewoners hebben geleverd. Na het bekijken van de film werd het schetsontwerp nader toegelicht. Bezoekers konden vragen stellen, reageren en hun voorkeur aangeven voor de kleur straatstenen die wordt gebruikt. Een ruime meerderheid van de bezoekers sprak haar voorkeur uit voor de kleur 'heide'. Die voorkeur nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp.



Compartimentering

Een belangrijk aspect in de strategie om wateroverlast tegen te gaan is de compartimentering van de wijk. De Bakenberg is verdeeld in vijf afzonderlijke gebieden (zie afbeelding 1). Elk gebied houdt zoveel mogelijk eigen water vast. Het overige regenwater stroomt via een aanpassing in de straten en een grote duiker de wijk uit.

Een voorbeeld hiervan is dat al het regenwater van de sportvelden (het hoogste punt op Bakenberg) op het sportcomplex wordt vastgehouden. Dit regenwater stroomt dus in de toekomst niet meer naar lageregelegen gebieden zoals Merkendal en Strolaan.


Prioritering

Op basis van de strategie met compartimentering heeft Roelofs doorgerekend welke locaties en compartimenten de grootste bijdrage leveren aan het oplossen van wateroverlast op de Bakenberg. Om de grootste wateroverlast op korte termijn tegen te gaan, wil het bouwteam op die locaties als eerste werkzaamheden uitvoeren (zie afbeelding 2).


Door de compartimentering wordt wateroverlast ook aangepakt op plekken waar niet direct werkzaamheden worden uitgevoerd.

Prioritering van de werkzaamheden is gebeurd op basis van de volgende aspecten: 1. Wateroverlast tegengaan, 2. Onderhoud nodig, 3. Cosmetische opknop.

Het is de planning om in het najaar van 2019 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

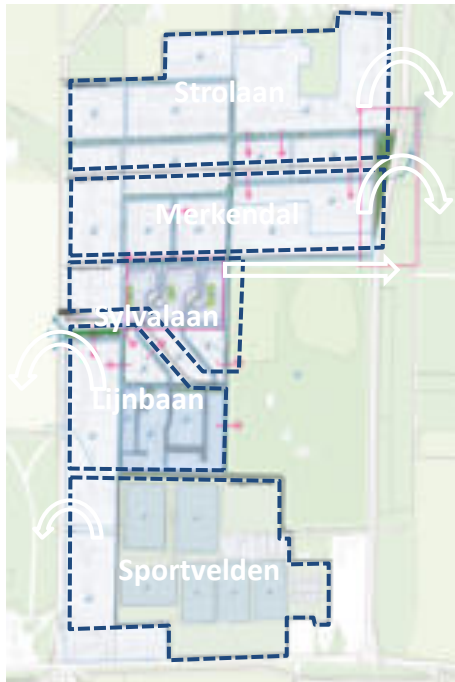

Afbeelding 1: strategie met 5 compartimenten

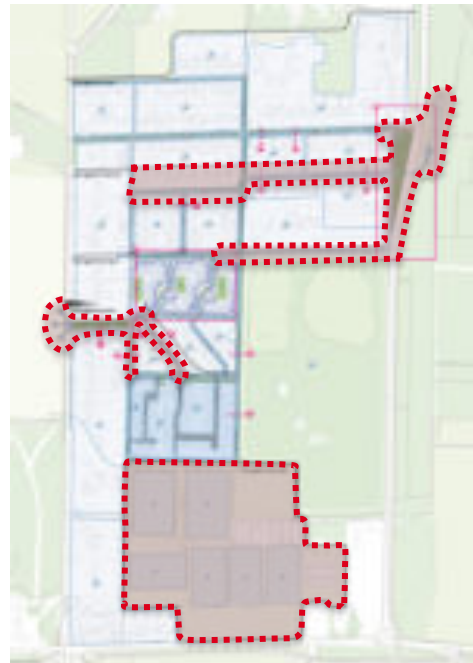

Afbeelding 2: Prioritering werkzaamheden

Reacties bewoners

Bewoners zijn blij dat er daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden. Over het algemeen zijn hun reacties op het schetsontwerp positief. Uiteraard kwamen er ook vragen en reacties. Vanaf 1 mei zijn die, inclusief de antwoorden erop, terug te lezen in de Frequently Asked Questions (FAQ) op de projectsite.

Vervolg

De schetsontwerpen worden in verder detail uitgewerkt.

Inloop op 15 en 16 mei

Op woensdag 15 mei en donderdag 16 mei zijn bewoners tussen 10.00 uur en 18.00 uur welkom om binnen te lopen op het projectkantoor van het bouwteam (in de kelder van Elver, Kemperbergerweg 1). U kunt dan het detailontwerp bekijken en daar nog laatste reacties op geven.

Buurtmarkt 29 juni

Op 29 juni tussen 10.00 uur en 13.00 uur vindt een buurtmarkt plaats op het grasveld bij Merkendal/Kemperbergerweg. Daar kunt u het definitieve ontwerp bekijken, hoort u meer over de uitvoeringsplanning en is er inspiratie op klimaatbestendig tuinieren in de wijk.

Alle tekeningen van het schetsontwerp, de FAQ en de introductiefilm die tijdens de inloop zijn getoond, zijn terug te vinden op www.roelofsgroep.nl/bakenberg.
